


Annexe D
Échéancier du
projet global et
échéancier détaillé
pour le pont
Athanasie-David



Séquence de réalisation des travaux - Parachèvement de l'autoroute 19

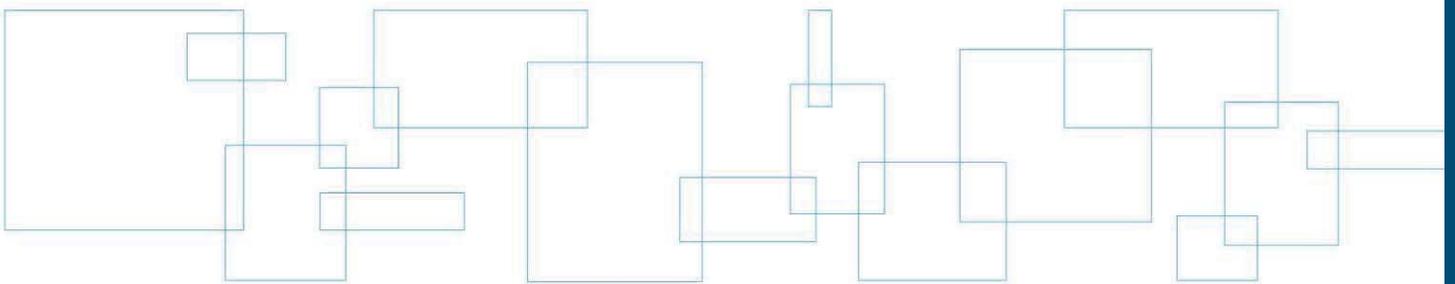

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Année 2												Année 3											
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M
1	PONT ATHANASE-DAVID	578 jours	Lun 13-05-13	Lun 15-07-27																								
2	PHASE 1 - PARTIE SUD (AXES 1 À 5)	146 jours	Lun 13-05-13	Ven 13-11-29																								
3	Mobilisation de chantier (incluant chemin d'accès)	4 sm	Lun 13-05-13	Ven 13-06-07																								
4	Début des travaux en eau Année 1	1 jour	Sam 13-06-15	Sam 13-06-15																								
5	Travaux de jetée SUD	2 sm	Lun 13-06-17	Ven 13-06-28																								
6	Culée AXE 1	74 jours	Mar 13-06-04	Jeu 13-09-12																								
20	Pile AXE 2	73 jours	Lun 13-06-24	Mer 13-10-02																								
35	Pile AXE 3	73 jours	Lun 13-06-24	Mer 13-10-02																								
50	Pile AXE 4	73 jours	Lun 13-07-15	Mer 13-10-23																								
65	Pile AXE 5	72 jours	Lun 13-07-15	Mar 13-10-22																								
80	TABLIER AXE 1-2	26 jours	Lun 13-09-23	Lun 13-10-28																								
88	TABLIER AXE 2-3	31 jours	Mer 13-09-25	Mer 13-11-06																								
96	TABLIER AXE 3-4	25 jours	Mer 13-10-16	Mar 13-11-19																								
104	TABLIER AXE 4-5	25 jours	Mer 13-10-16	Mar 13-11-19																								
112	Démantèlement de la jetée SUD	2 sm	Lun 13-11-18	Ven 13-11-29																								
113	PHASE 2 - PARTIE NORD (AXES 5 À 9)	162 jours	Lun 14-04-21	Lun 14-12-01																								
114	Fermeture de la rue Perron	1 jour	Lun 14-04-21	Lun 14-04-21																								
115	Début des travaux en eau Année 2	1 jour	Dim 14-06-15	Dim 14-06-15																								
116	Travaux de jetée NORD	2 sm	Lun 14-06-16	Ven 14-06-27																								
117	Culée AXE 9	70 jours	Mar 14-04-22	Ven 14-07-25																								
131	Pile AXE 8	73 jours	Lun 14-07-14	Mer 14-10-22																								
146	Pile AXE 7	73 jours	Lun 14-06-23	Mer 14-10-01																								
161	Pile AXE 6	73 jours	Lun 14-06-23	Mer 14-10-01																								
176	TABLIER AXE 5-6	26 jours	Lun 14-09-22	Lun 14-10-27																								
184	TABLIER AXE 6-7	25 jours	Mer 14-09-24	Mar 14-10-28																								
192	TABLIER AXE 7-8	26 jours	Lun 14-10-13	Lun 14-11-17																								
200	TABLIER AXE 8-9	25 jours	Mer 14-10-15	Mar 14-11-18																								
208	Démantèlement de la jetée NORD	2 sm	Mar 14-11-18	Lun 14-12-01																								
209	Réfection Rue Perron - couche de base	1 sm	Lun 14-10-27	Ven 14-10-31																								
210	PHASE 3 - FINAL	81 jours	Lun 15-04-06	Lun 15-07-27																								
211	Mobilisation Année 3	1 jour	Lun 15-04-06	Lun 15-04-06																								
212	Début travaux chaussée - fin dégel	1 jour	Ven 15-05-15	Ven 15-05-15																								
213	Chaussée	41 jours	Lun 15-05-18	Lun 15-07-13																								
219	Tablier	52 jours	Mar 15-04-07	Mer 15-06-17																								
225	Démobilisation	10 jours	Mar 15-07-14	Lun 15-07-27																								

